Ooms Construction bv

Revitalisering Dorpstraat Oostwoud

45.87. .
opdrachtgever:Gemeente Medemblik

Id	Taaknaam	Hoeveelheid	Eenheid	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Revitalisering Dorpsstraat Oostwoud**			**30 dagen**	**din 15-8-17**	**maa 25-9-17**
2	**Voorbereidende werkzaamheden**			**13 dagen**	**din 15-8-17**	**don 31-8-17**
3	Rondbezorgen bewonersbrieven		stuk	1 dag	din 15-8-17	din 15-8-17
4	Plaatsen Vooraankondigingsborden			1 dag	din 15-8-17	din 15-8-17
5	Verkeersmaatregelen / omleiding	1	stuk	1 dag	woe 30-8-17	woe 30-8-17
6	Verwijderen markering d.m.v. frezen	21	m1	1 dag	don 31-8-17	don 31-8-17
7	frezen deklaag	3663	m2	1 dag	don 31-8-17	don 31-8-17
8	**Fase 1 Zuidzijde Dorpstraat**			**6 dagen**	**maa 4-9-17**	**maa 11-9-17**
9	Opnemen straatbaksteen	1362	m2	4 dagen	maa 4-9-17	don 7-9-17
10	Verwijderen straatlaag	1362	m2	4 dagen	maa 4-9-17	don 7-9-17
11	Uitvullen met menggranulaat	1362	m2	4 dagen	maa 4-9-17	don 7-9-17
12	Aanbrengen onderlaag asfalt 70 mm AC 22 base	238	ton	4 dagen	din 5-9-17	vri 8-9-17
13	Frezen aansluiting breed 50 cm	1020	m1	1 dag	maa 11-9-17	maa 11-9-17
14	Aanbrengen tussenlaag 40 mm AC 16 bin	186	ton	1 dag	maa 11-9-17	maa 11-9-17
15	**Fase 2 - Noordzijde Dorpstraat**			**5 dagen**	**din 12-9-17**	**maa 18-9-17**
16	Opnemen straatbaksteen	1006	m2	3 dagen	din 12-9-17	don 14-9-17
17	Verwijderen straatlaag	1006	m2	3 dagen	din 12-9-17	don 14-9-17
18	Uitvullen met menggranulaat	1006	m2	3 dagen	din 12-9-17	don 14-9-17
19	Aanbrengen onderlaag asfalt 70 mm AC 22 base	176	ton	3 dagen	woe 13-9-17	vri 15-9-17
20	Frezen aansluiting breed 50 cm	1020	m1	1 dag	maa 18-9-17	maa 18-9-17
21	Aanbrengen tussenlaag 40 mm AC 16 bin	150	ton	1 dag	maa 18-9-17	maa 18-9-17
22	**Fase 3 - Aanbrengen toplaag Dorpstraat**			**5 dagen**	**din 19-9-17**	**maa 25-9-17**
23	Frezen bakken diep 50 mm en inlagen met AC 16 base	305	m2	1 dag	din 19-9-17	din 19-9-17
24	Schoonmaken wegdek	5960	m2	1 dag	din 19-9-17	din 19-9-17
25	Aanbrengen asfalt SMA t.b.v. parkeerplaatsen	300	m2	1 dag	din 19-9-17	din 19-9-17
26	Aanbrengen kleeflaag	5960	m2	1 dag	woe 20-9-17	woe 20-9-17
27	Aanbrengen asfalt SMA Zwart/Rood - Zwart/Grijs-Wit	5660	m2	1 dag	woe 20-9-17	woe 20-9-17
28	Aanbrengen markeringen 1 - 1 streep en figuratie	2040	m1	1 dag	don 21-9-17	don 21-9-17
29	Zagen asfalt	1320	m1	1 dag	vri 22-9-17	vri 22-9-17
30	Verwijderen en afvoeren verkeersmaatregelen	1	stuk	1 dag	maa 25-9-17	maa 25-9-17

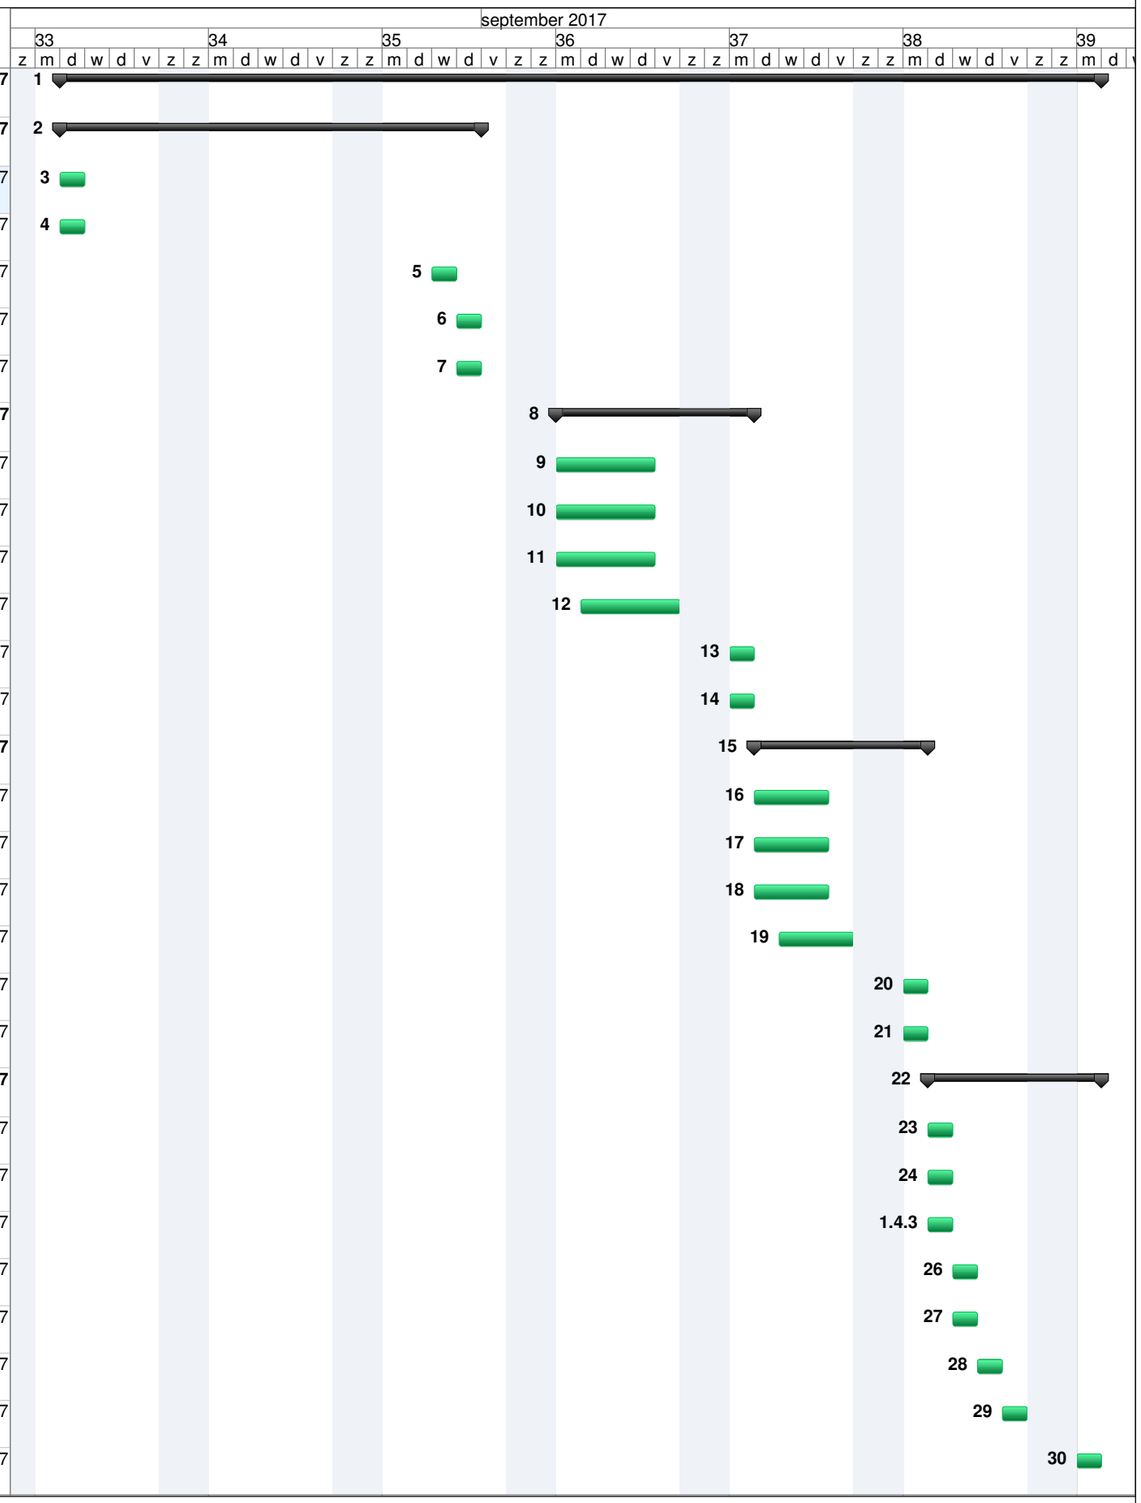

Datum: woe 17-5-17
Arie Haakman

Taak	Projectsamenvatting	Inactieve mijlpaal	Handmatige samenvatting	Voortgang
Splitsing	Externe taken	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting	Deadline
Mijlpaal	Externe mijlpaal	Handmatig taak	Alleen begindatum	
Samenvatting	Inactieve taken	Alleen duur	Alleen einddatum	
